

מס': 1503563
מס' מוביל: 123397

1. פרטי הלקוח וזיהוי ההזמנה:

שם המזמין: מכללה האקדמית כנרת	כתובת: ישראל, ד.ג. עמק הירדן צמח 1513200
מס' פרויקט: 46175	מס' הסכם
	תאריך ההזמנה:

2. מהות הבדיקה:

בדיקת ערכי לחץ סטטי, שיורי וספיקת מים בהתאם לתקן ישראל 1596 - NFPA 13, ובהתאם להוראות נציב 529, באמצעות מד ספיקה ונטורי מדגם פיטו.

3. פרטים על המערכת שנבדקה:

שם הפרוייקט: מכללת כנרת עמק הירדן	כתובת האתר: מתחם המכינה במכללה האקדמית כנרת
שם נציג המזמין שהיה נוכח בבדיקה: יפתח	תפקידו: נציג מטעם מזמין הבדיקה
תאגיד מים:	שם נציג תאגיד מים:

4. פרטי הבדיקה:

תאריך בדיקה: 16/06/2021	שעת הבדיקה: 10:10	קוטר פתח ברז כיבוי האש: 3"
בדיקה בקווי מים עירוניים.	✓ בדיקה ברשת מים פנימית.	מערכת עם הגברת לחץ. מערכת ללא הגברת לחץ. ✓
מיקום נקודת בדיקת: לחץ: על גבי יציאה 2" במקום שסתום אוויר ולפני מקטין לחץ בגמל מים ליד שער חירום דרומי		
ספיקה: על גבי הידרנט 3" ולפני מקטין לחץ בגמל מים ליד שער חירום דרומי		

מקום הבדיקה נקבע ע"י ב"כ המזמין.


5. תוצאות הבדיקה:

קוטר נחיר הבדיקה: "1-1/2 לחץ דינמי: PSI 17.40

ספיקה		לחץ		
GPM	ליטר / דקה	PSI	בר	
---	---	88.0	6.1	לחץ סטטי:
286	1083	21.8	1.5	לחץ שיורי:
תוצאות בדיקת הלחץ מתייחסות לגובה פתח ההידרנט שנבדק.				

שם הבודק:	תמיר עייש	חתימה:	סיסטם מעבודות מתקדמות בע"מ
שם המאשר:	תמר דוד, סמנכ"ל הנדסה	חתימה:	תמר דוד M.Sc סמנכ"ל הנדסה

משרדי הנהלה: פארן 4, "פארק טכנולוגי יבנה" בניין 3, יבנה 8122503
 טל: 08-9426736, פקס: 08-9420537
 סניף מרכז: הימין 1, "מול הצומח", יבנה 8122005
 סניף דרום: יהודה הנחתום 3, באר-שבע 8424920
 סניף ירושלים: קיבוץ מעלה החמישה ד.ג. הרי יהודה 9083500
 סניף חיפה: יוחנן הסנדלר 20, א.ת. צ'ק פוסט (בניין שרון) 3296220
 סניף השרון: רח' קומבה 2, א.ת. חדרה 3850135
 סניף אילת: רח' התבונה 10, אילת 8850554
 סניף אגף מיגון אש: פארן 4, "פארק טכנולוגי יבנה" בניין 3, יבנה 8122503

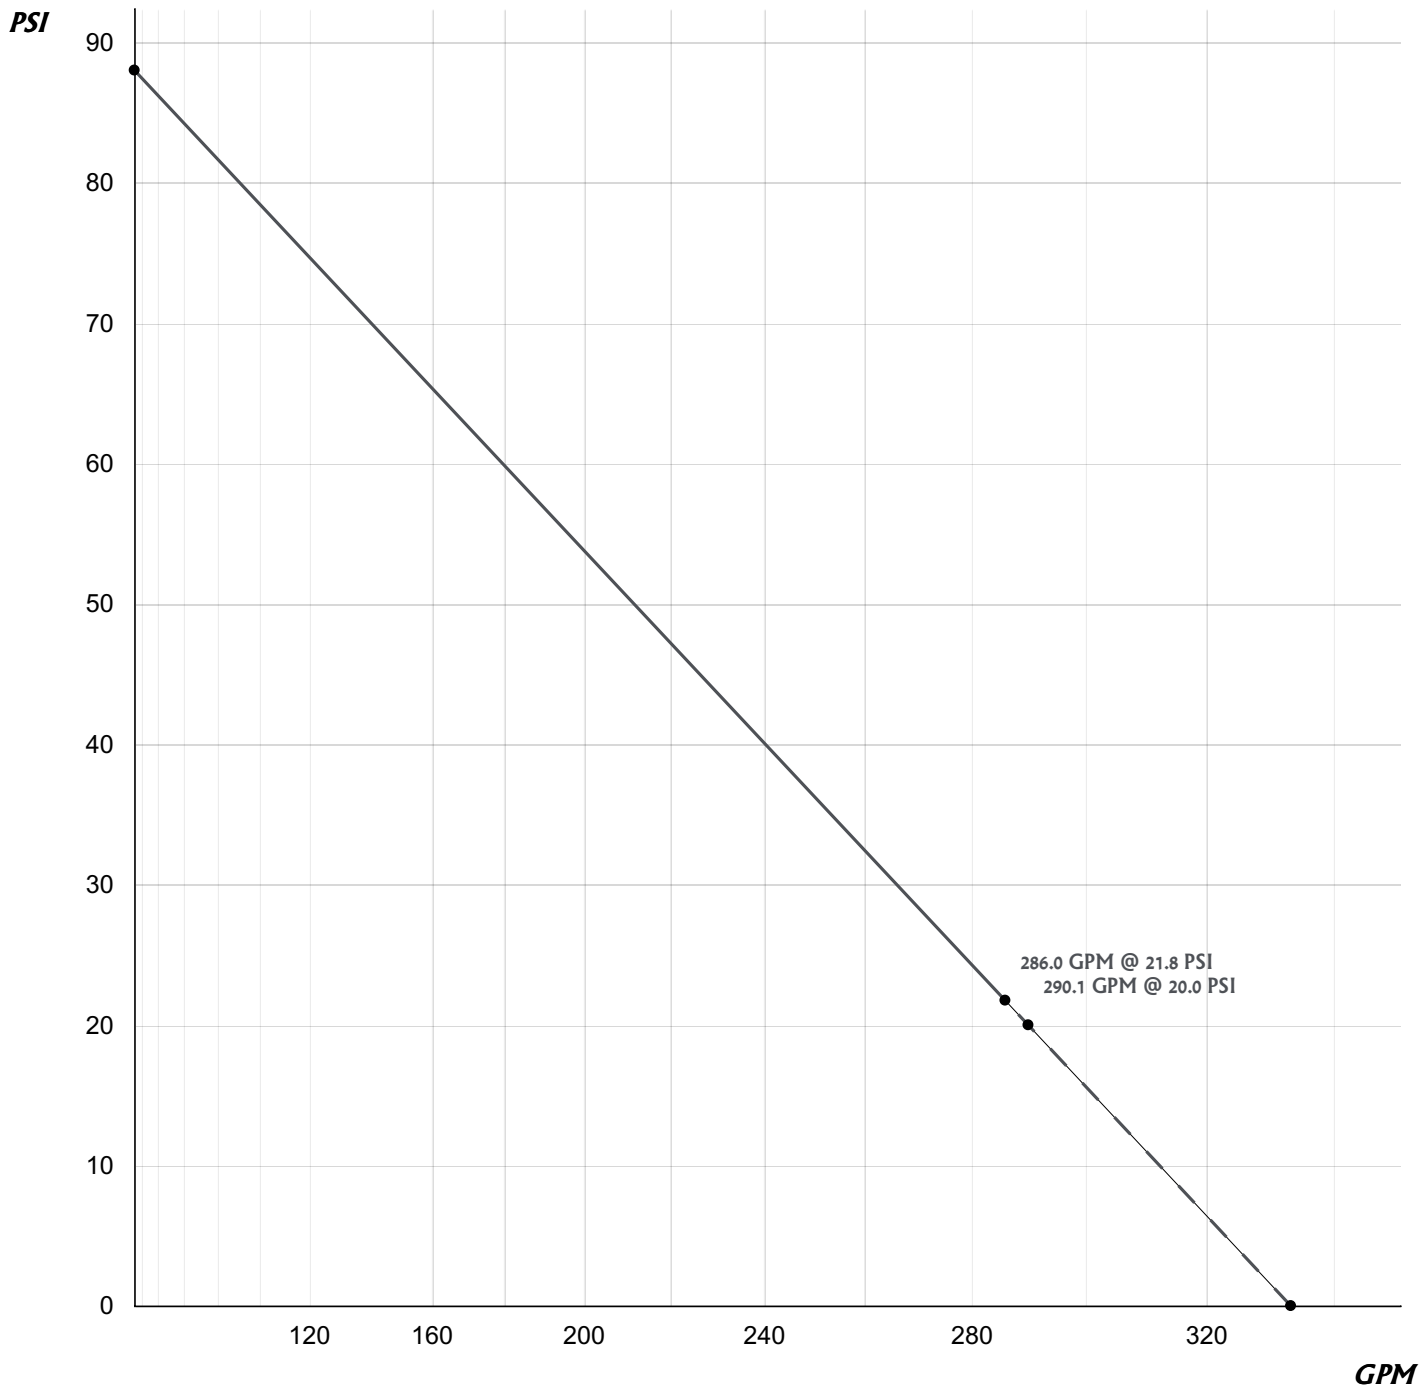

הערות:

- הספיקה בלחץ של 20PSI היא ספיקה מחושבת (תיאורטית) והוספה אל הגרף בהתאם לדרישת שרותי כבאות.
